Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
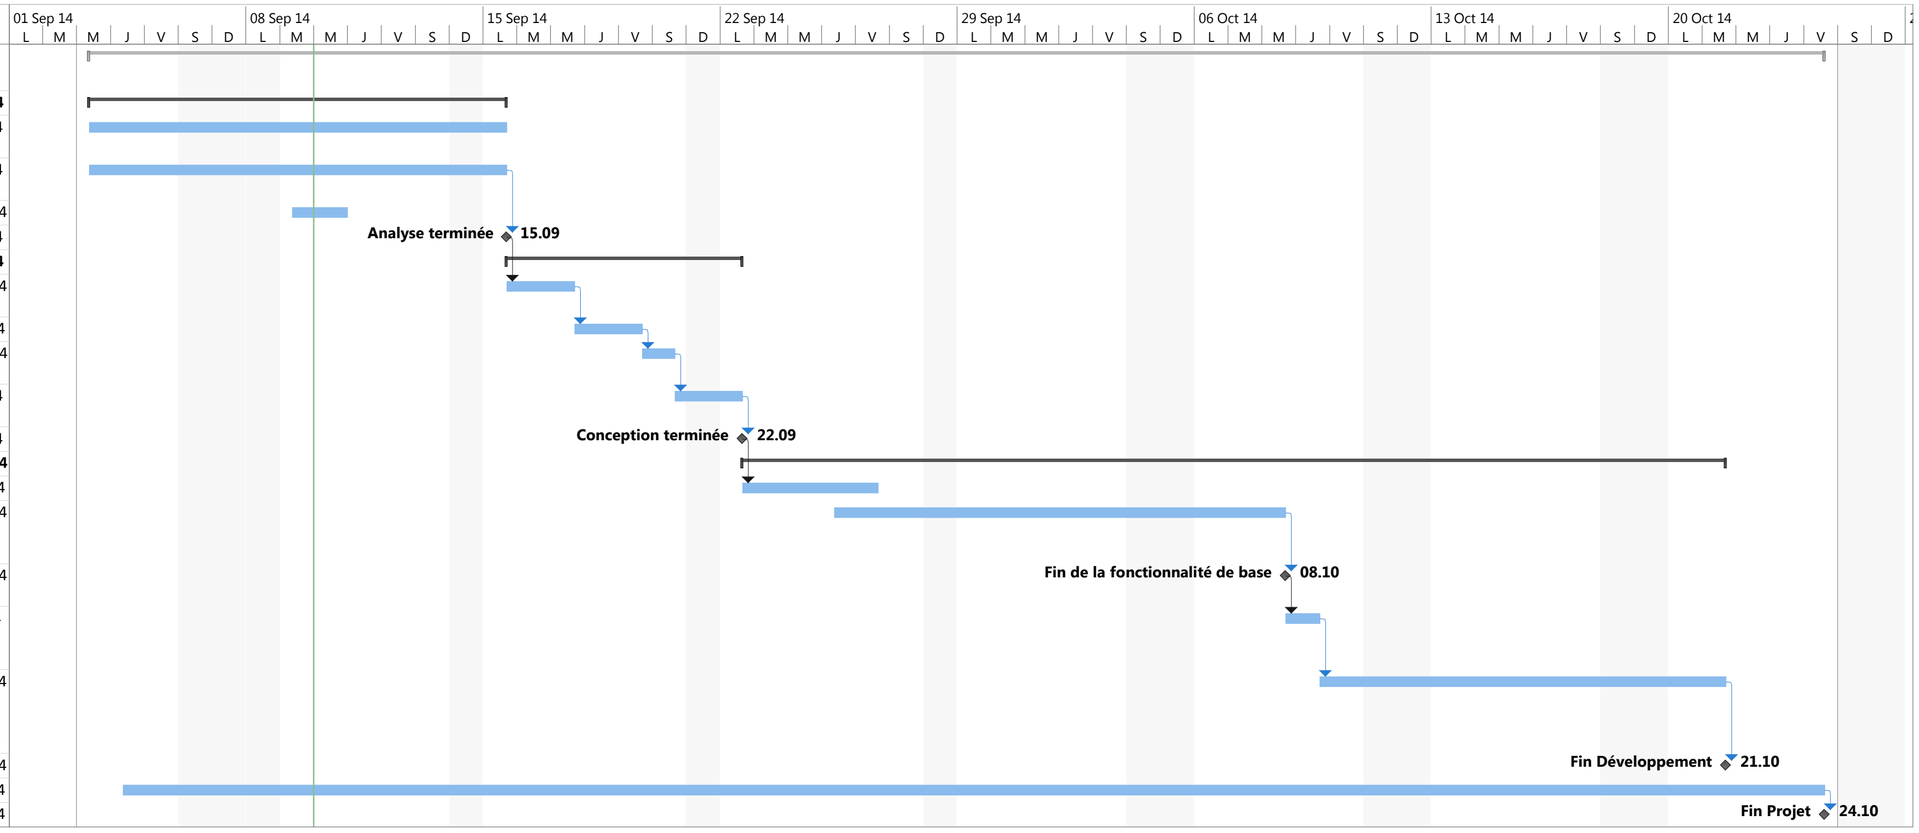
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
0	**Info Trafic**	**40 jours**	**Mer 03.09.14**	**Ven 24.10.14**
1	**Analyse**	**9 jours**	**Mer 03.09.14**	**Lun 15.09.14**
2	Etats d'art des services d'info trafic routier	9 jours	Mer 03.09.14	Lun 15.09.14
3	Inventaires des services web de cartographie	9 jours	Mer 03.09.14	Lun 15.09.14
4	Planning	2 jours	Mar 09.09.14	Mer 10.09.14
5	Analyse terminée	0 jour	Lun 15.09.14	Lun 15.09.14
6	**Conception**	**6 jours**	**Lun 15.09.14**	**Lun 22.09.14**
7	Choix des modes de représentation	2 jours	Lun 15.09.14	Mer 17.09.14
8	Choix des outils	2 jours	Mer 17.09.14	Ven 19.09.14
9	Choisir une stratégie de représentation	1 jour	Ven 19.09.14	Sam 20.09.14
10	Choix des données nécessaires	1 jour	Sam 20.09.14	Lun 22.09.14
11	Conception terminée	0 jour	Lun 22.09.14	Lun 22.09.14
12	**Développement**	**22.29 jours**	**Lun 22.09.14**	**Mar 21.10.14**
13	Prise en main des outils	4 jours	Lun 22.09.14	Ven 26.09.14
14	Représentation densité du trafic (testet validation incl.)	11 jours	Jeu 25.09.14	Mer 08.10.14
15	Fin de la fonctionnalité de base	0 jour	Mer 08.10.14	Mer 08.10.14
16	Choix des Fonctionnalités Organisateurs	1 jour	Mer 08.10.14	Jeu 09.10.14
17	Implémentation des Foctionnalités Organisateurs (test et validation incl.)	8 jours	Jeu 09.10.14	Mar 21.10.14
18	Fin Développement	0 jour	Mar 21.10.14	Mar 21.10.14
19	Rapport	39 jours	Jeu 04.09.14	Ven 24.10.14
20	Fin Projet	0 jour	Ven 24.10.14	Ven 24.10.14
